


# Glasfaser Ausbauplanung Gronau & Epe



Zusammen für die Zukunft:

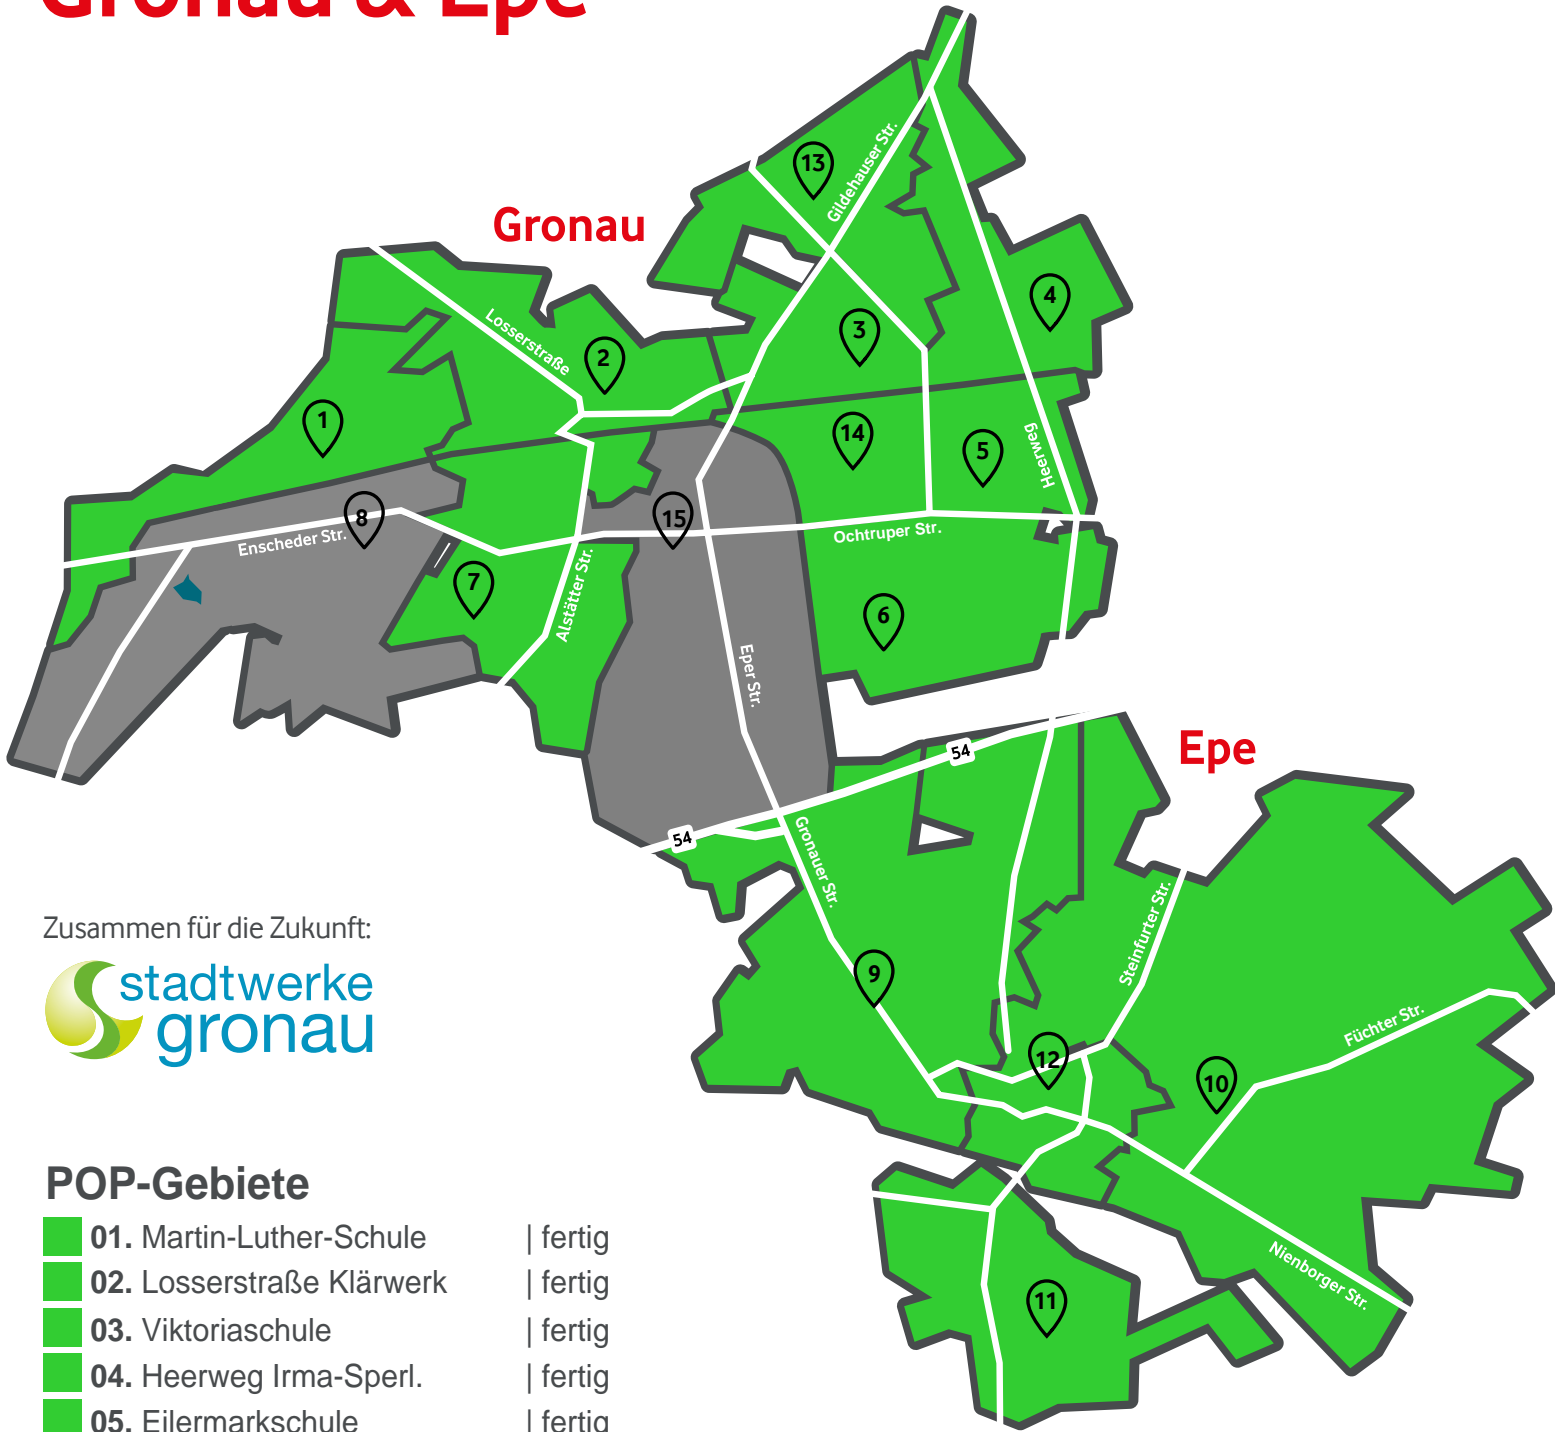

## POP-Gebiete

<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 01. Martin-Luther-Schule	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 02. Losserstraße Klärwerk	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 03. Viktoriaschule	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 04. Heerweg Irma-Sperl.	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 05. Eilermarkschule	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 06. Hallenbad	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 07. Driland-Kolleg Iltisstr.	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#808080; border:1px solid black;"></span> 08. Buterlandschule	Q4 2024 – Q2 2026 (Verzögerungen im Tiefbau)
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 09. Euregioschule Epe	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 10. Georgschule	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 11. Ahauser Straße	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 12. Gasstraße Laurenzstraße	80% fertig   20% in Q1 2026
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 13. Gildehauser Straße	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#00b050; border:1px solid black;"></span> 14. Pestalozzischule	fertig
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#808080; border:1px solid black;"></span> 15. Rathaus Gronau	Q1 2025 – Q2 2026 (Verzögerungen im Tiefbau)

Stand 01.2026: Dieser Plan dient der Illustration des Baufortschritts und stellt keinen rechtsverbindlichen Anspruch auf einen Termin zur Inbetriebnahme des Glasfaseranschlusses in den genannten Zeiträumen dar. Auch können wetterbedingte sowie sonstige nicht planbare externe Einflüsse zu Anpassungen führen. Materiallieferungen, Genehmigungsprozesse und sich verändernde Tiefbaukapazitäten können sich ebenso auf die Planung auswirken. Dieser Plan wird laufend aktualisiert.

Deine Stadtwerke Gronau GmbH als Bauherr und Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf als Betreiber

